Principe de montage d'un module maison individuelle

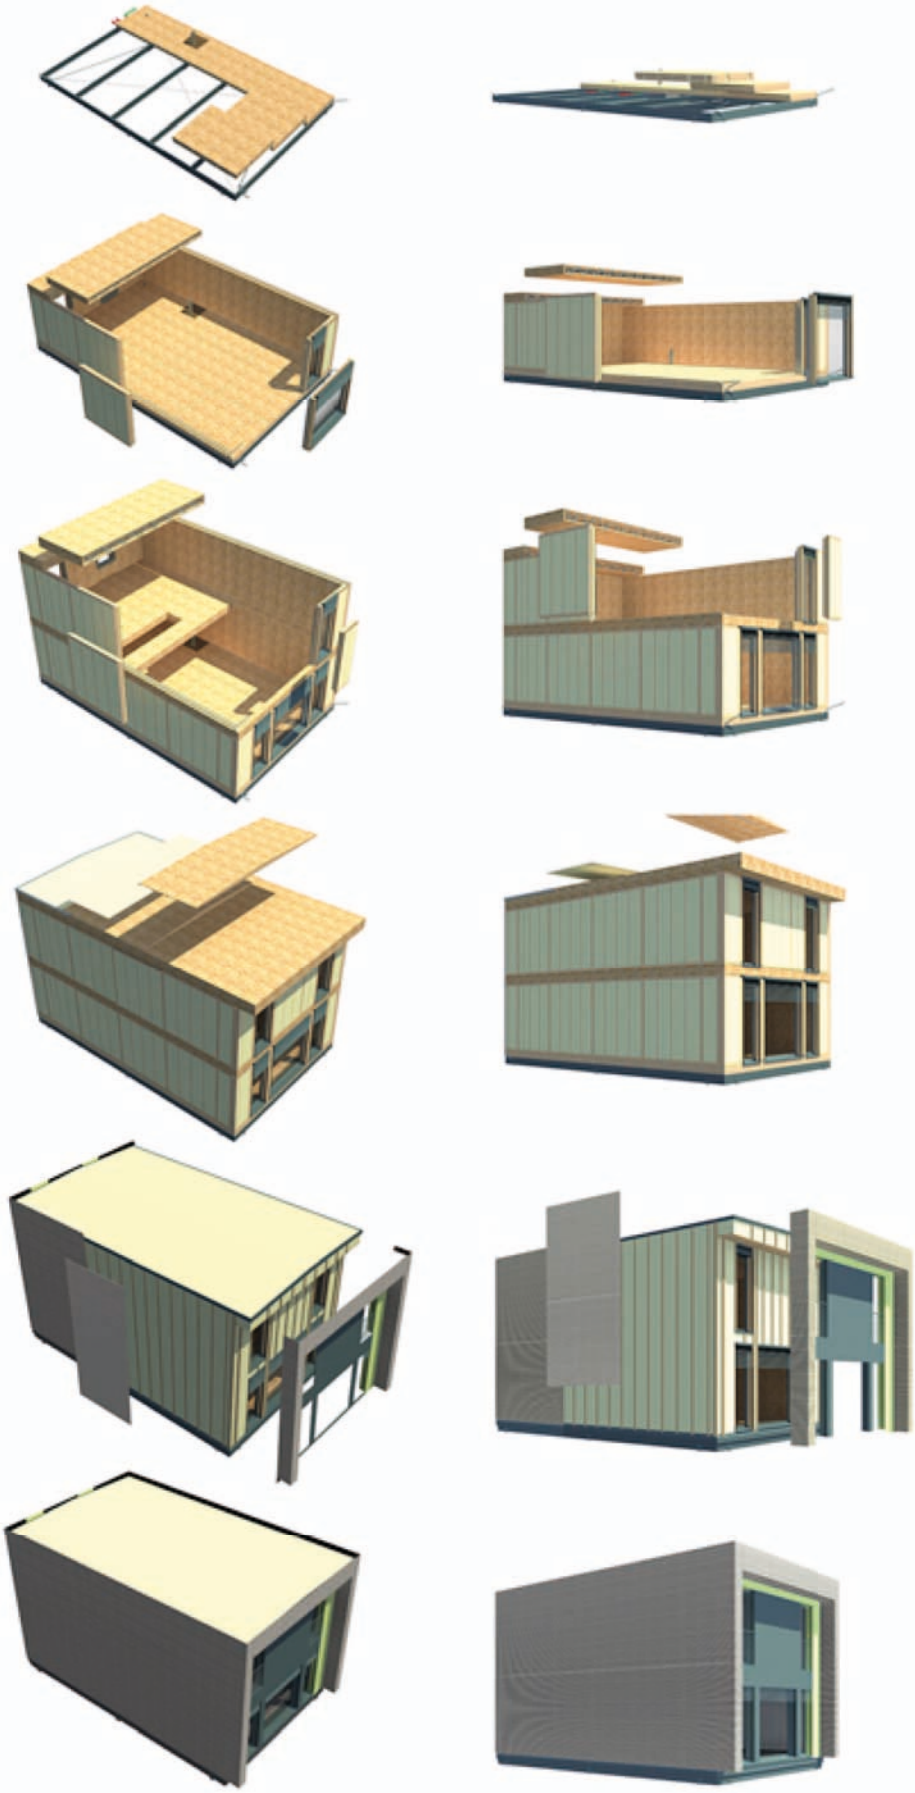

Phase 1 = *4 jours*
Conception architecturale
et plans techniques

Phase 2 = *8 jours*
Pré assemblage de la maison
en usine avec éléments livrés

Phase 3 = *3 jours*
Préparation du chantier
et attente réseaux

Phase 4 = *2 jours*
Transport de la maison
sur 2 camions
avec container et plateau

Phase 5 = *3 jours*
Montage du cadre VS métal
et des caissons de sol RDC
y compris raccordement réseau

Phase 6 = *3 jours*
Montage des murs RDC
et des caissons étage

Phase 7 = *3 jours*
Montage des murs étage
et des caissons de toiture

Phase 8 = *3 jours*
Couverture et étanchéité
à l'air à l'eau plus test
y compris raccordement EP

Phase 9 = *3 jours*
Habillage
des façades extérieures

Phase 10 = *10 jours*
Montage complet
du second oeuvre
y compris appareillage

Phase 11 = *3 jours*
Remise en place des terres
et aménagements extérieurs

Total phases = 45 jours
Conception et réalisation d'une maison moyenne de 84 m²
